

**Certificaat DEEL I van II (Voorblad) Wettelijke eindcontrole na asbestsanering conform NEN 2990:2020+C1:2020**

Projectnummer Check BV: 6.006.0821


Let op: Bij projectnummer, aangevuld met een revisienummer, komen alle vorige certificaten van deze eindcontrole na asbestverwijdering te vervallen!

Zaandam, 4 april 2026



Opdrachtgever: Arie Hollenberg sloop & milieuwerken B.V.

Asbestverwijderingsbedrijf:  
Arie Hollenberg sloop & milieuwerken B.V.  
t.a.v. afdeling Asbestsanering  
Vredenburgweg 1  
1461 GT Zuidoostbeemster

Ref.nr. opdrachtgever: 26-0191  
Kenmerk inventarisatierapport: Buro Inventas , 20260092 , versie 1 (12 maart 2029 )  
Meldingsnummer: 1699290

Contactpersoon:  

**Onderzoeksgegevens**

Type onderzoek: Wettelijke eindcontrole onder accreditatie  
Visuele inspectie  
Asbestconcentratiemetingen, zie bijlagen.  
Plaats van onderzoek:  te Heemstede  
Risicoklasse SZW: 2  
Containment: Ja  
Datum controle: 2-apr-26  
Aanvang werkzaamheden : 16:40  
Eind werkzaamheden : 19:40  
Tijdsduur visuele inspectie (min): 30  
Inspecteur: 

**Omschrijving werkzaamheden en/of werkplek**

Omschrijving werkzaamheden en/of werkplek: Het betreft een eindinspectie na het saneren van vinylzeil vanaf de vloer van de keuken van de woning gelegen op de vijfde verdieping

Inhoud containment (m<sup>3</sup>): 30  
Afmeting containment (m<sup>2</sup>): 11  
Aantal segmenten: 1

Gesaneerde bronnummer(s) cf. inv. rapport:

Bron nr. cf. inv. rapport	Materiaal	Soort Asbest	Gehalte	Gebondenheid
1	Vinylzeil (9 m <sup>2</sup> )	chrysotiel	30-60%	niet-hechtgebonden

**Conclusie visuele inspectie conform NEN 2990:2020:C1:2020**

In orde bevonden. De ruimte of locatie voldoet WEL aan de in NEN 2990:2020+C1:2020 gestelde criteria voor eindcontrole;

**Conclusie concentratiemeting conform NEN 2990:2020+C1:2020**

De berekende gemiddelde concentraties in de gemeten ruimten zijn, getoetst aan de bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval, NIET normoverschrijdend (grenswaarde ministerie van SZW).

**Eindconclusie conform NEN 2990:2020+C1:2020**

**De onderzochte ruimte(n) of locaties (s) voldoen aan de criteria voor eindcontrole NEN 2990:2020+C1:2020 en mogen conform artikel 4.51a van het Arbeidsomstandighedenbesluit WEL zonder gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen betreden worden.**

**Opmerkingen**

Zie deel II, het bevindingenrapport voor gedetailleerde informatie over de uitgevoerde visuele inspectie en/of luchtmeting (opmerkingen, uitsluitingen en beperkingen). Dit certificaat (deel I) is onlosmakelijk verbonden met deel II (het bevindingenrapport) met hetzelfde projectnummer van Check BV. Op alle offertes, opdrachten en rapporten van Check BV zijn de voorwaarden van de DNR2011 van toepassing.

Handtekening inspecteur Check BV:



  
Digitaal gegenereerde handtekening 

Handtekening DTA:

  
Digitaal gegenereerde handtekening 






**Certificaat DEEL II van II (Bevindingenrapport Eindcontrole na asbestsanering conform NEN 2990:2020+C1:2020)**  
**Concentratiemeting conform NEN 2990:2020+C1:2020**

Behorende bij Check BV projectnummer: 6.006.0821

Let op: Bij projectnummer, aangevuld met een revisienummer, komen alle vorige certificaten van deze eindcontrole na asbestverwijdering te vervallen!

**Opdrachtgever:** Arie Hollenberg sloop & milieuwerken B.V.

**Asbestverwijderingsbedrijf**

Arie Hollenberg sloop & milieuwerken B.V.  
t.a.v. afdeling Asbestsanering  
Vredenburgweg 1  
1461 GT Zuidoostbeemster  
Ref.nr. opdrachtgever 26-0191  
Contactpersoon 

Zaandam, 4-04-26

**Onderzoeksgegevens**

Type onderzoek: Wettelijke eindcontrole  
Concentratiemeting  
Datum controle: Incl. visuele inspectie. Zie bijgesloten pagina.  
2 april 2026

**Resultaat visuele inspectie, samengevat**

Op de omschreven locaties zijn, op het moment van de inspectie, GEEN visueel waarneembare asbestresten c.q. asbestverdachte materialen of stof\* aangetroffen, de benoemde uitsluitingen en opmerkingen in acht genomen.

**Gebruikte apparatuur voor monsterneming en microscopie:**

Merk en type microscoop: Euromex binoculaire Model "F" range  
Blok 5 zichtbaar: ja  
Filtertype: MCE Filters - Green Grid, 25mm, 0,8µm

**Resultaat luchtmetingen**

nr.	Omschrijving monsterpositie	Nummer Pomp/Filterkop	Ruimte nummer tekening					Concentratie [vezels /m <sup>3</sup> ]			Toets nominaal > 10.000 v/m <sup>3</sup> werkplek-metingen	Toets > 10.000 v/m <sup>3</sup> eindmetingen	
				Absoluut begindebiet (L/min)	Absoluut einddebiet (L/min)	Getelde vezels	Getelde velden	Meetduur (min)	Nominaal	Onder-grens			Boven-grens
1	In het containment	PMP-050	1	8,5	8,2	3	100	121	1.307	270	3.820	nee	nee
2	In het containment	PMP-051	1	8,5	8,4	2	100	121	860	104	3.105	nee	nee
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gem.	Ruimte 1	Nominaal	Onder-grens	Boven-grens	Nominaal gemiddelde overschreden?	Bovengrens gemiddelde overschreden?
		1.082	351	2.525	nee	nee
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
Luchtvochtigheid buiten = 71 %	-	-	-	-	-	
Luchtvochtigheid binnen = 70 %	-	-	-	-	-	

**Conclusie Eindcontrole na asbestsanering conform NEN 2990:2020+C1:2020**

- Op de omschreven locaties zijn, op het moment van de inspectie, GEEN visueel waarneembare asbestresten c.q. asbestverdachte materialen of stof\* aangetroffen, de benoemde uitsluitingen en opmerkingen in acht genomen.
- De berekende gemiddelde concentraties in de gemeten ruimten zijn, getoetst aan de bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval, NIET normoverschrijdend (grenswaarde ministerie van SZW).
- De onderzochte locaties zijn WEL vrijgegeven.




Check BV: Technisch Manager



\*) exclusief stof bij visuele inspecties

**Certificaat DEEL II van II Bevindingenrapport Tekeningblad**

Certificaat DEEL II van II (Bevindingenrapport): 6.006.0821		Let op: Bij projectnummer, aangevuld met een revisienummer, komen alle vorige certificaten van deze eindcontrole na asbestverwijdering te vervallen!
Plaats van onderzoek	█ te Heemstede	
Type onderzoek	Wettelijke Eindcontrole onder accreditatie - Visuele inspectie. Asbestconcentratiemetingen, zie bijgesloten pagina.	
Omschrijving werkplek	Het betreft een eindinspectie na het saneren van vinylzeil vanaf de vloer van de keuken van de woning gelegen op de vijfde verdieping	

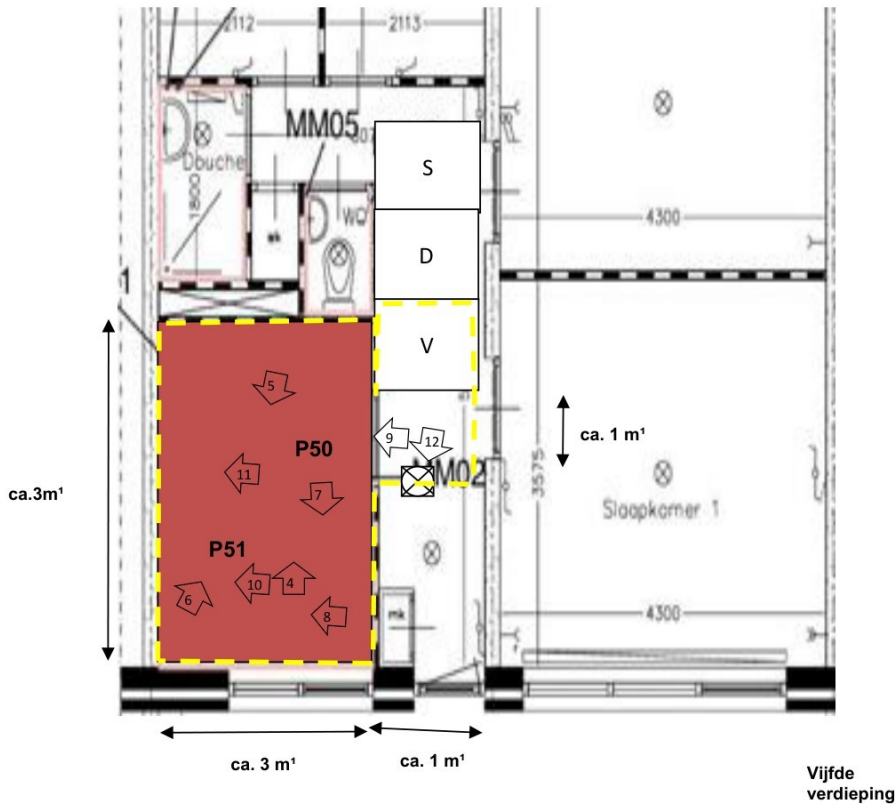

	<b>Gesaneerde bron: 1 Vinylzeil</b>
	<b>Het onderzoek richt zich binnen deze inspectielijnen</b>
	<b>Foto standplaats</b>

**Legenda**

Opm: Tekening is niet op schaal

Hoogte per verdieping 2,7 meter

<b>Legenda:</b>													
Inspectiegebied													
						<b>Meetpunten monsterneming</b>							
						<b>P1</b>	<b>P2</b>	<b>P3</b>	<b>P4</b>	<b>P5</b>			
						<b>P6</b>	<b>P007</b>	<b>P008</b>	<b>P009</b>				

Check BV projectnr.	6.006.0821
Plaats van onderzoek	[redacted] te Heemstede
Type onderzoek	Wettelijke Eindcontrole onder accreditatie - Visuele inspectie. Asbestconcentratietingen, zie bijgesloten pagina.
Omschrijving werkplek	Het betreft een eindinspectie na het saneren van vinylzeil vanaf de vloer van de keuken van de woning gelegen op de vijfde verdieping

Foto 1: Vooraanzicht woning/object

Foto 2: Huisnummer

Foto 3: Deco-sluis



Foto 4: Muur/wand/plafond/wand

Foto 5: Muur/wand/plafond/wand

Foto 6: Pomp 050 en Pomp 051



Foto 7: Locatie Gesaneerde bron: 1 Vinylzeil

Foto 8: Locatie Gesaneerde bron: 1 Vinylzeil

Foto 9: Locatie Gesaneerde bron: 1 Vinylzeil



Check BV projectnr.	6.006.0821
Plaats van onderzoek	[redacted] te Heemstede
Type onderzoek	Wettelijke Eindcontrole onder accreditatie - Visuele inspectie. Asbestconcentratiemetingen, zie bijgesloten pagina.
Omschrijving werkplek	Het betreft een eindinspectie na het saneren van vinylzeil vanaf de vloer van de keuken van de woning gelegen op de vijfde verdieping

**Foto 10:** Locatie Gesaneerde bron: 1 Vinylzeil

**Foto 11:** Locatie Gesaneerde bron: 1 Vinylzeil


**Foto 12:** Onderdrukmaschine



**Foto 13:** Verzegeling van het containment

**Foto 14:** .....


**Foto 15:** .....



**Foto 16:** .....

**Foto 17:** .....

**Foto 18:** .....



## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen
